



반포주공1단지 [1, 2, 4주구] 제3차 석면 합동 협의회

■ 제2차 회의보고

□ 일 시 : 2022.07.11. (월) 13:00

□ 장 소 : 서울 서초구 신반포로 45 (반포본동 812 반포주공아파트 52동)

□ 참석자 : (사)석면피해예방지원센터 이사장최미경 외 1명, (주)천호엔지니어링 현장소장이재민, (주)유비건축 사사무소 부장노갑기, (주)유비건축사사무소 부장유병기, (주)천호엔지니어링 현장소장최현석, 서초구청 기후환경과 팀장김정순, 서초구청 기후환경과 주무관 지희순, 시민감시단 정은주, 시민감시단 이경은 외 1명

□ 논의안건

1호 안건

- 비닐 보양 점검 시 유의 사항

○ 표지판 설치



○ 위생설비 및 폐기물 반출구 확인

※ 위생설비 출입 전 음압 기록장치를 확인하도록 한다.

작업장 외부와 내부의 음압은 작업 중 작업자의 출입과 작업공간 공기의 흐름에 따라 음압이 깨지는 경우가 발생함으로 최초 **-0.508mmH₂O**를 유지한 상태에서 작업을 시작하도록 한다.



평상복탈의실 개인용품보관함



샤워실



작업복 탈의실



○ 작업장 출입순서


평상복 탈의실→샤워실→작업복 탈의실→작업장

○ 작업장 퇴실 순서

작업장→작업복 탈의실→샤워실→평상복탈의실

※ 작업장 내부에서 음압이 공기를 작업장으로 유입함으로 위생시설을 통해 분진이 외부로 비산되지 않음.

○ 음압기 설치

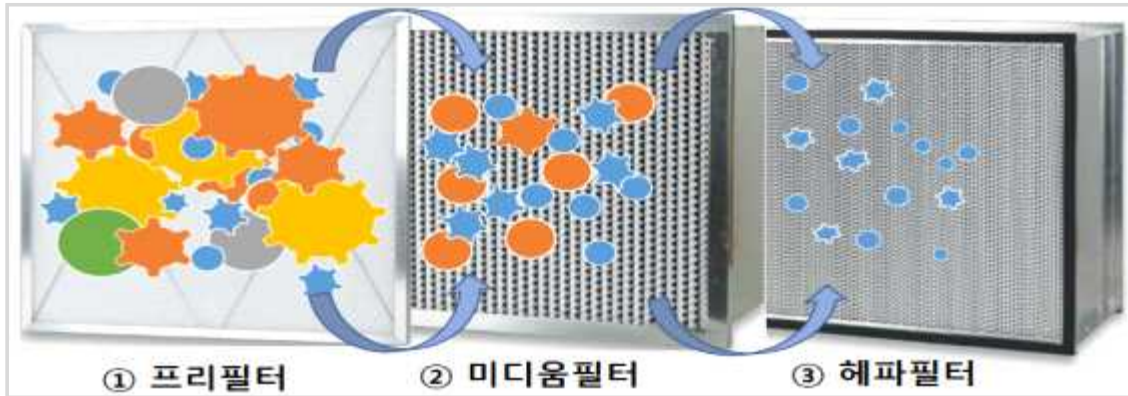

※ 당해 현장 필터 교체주기 : 프리필터일1회, 미디움필터2주 1회, HEPA필터 월 1회
 ※ 비산 측정 결과는 서초구청 익일 즉시 보고

○ 비닐 보양 작업장 내부 점검

- 음압으로 비닐을 고정한 테이프가 떨어지거나 고정상태가 불안할 경우 보안 요청
- 비닐이 찢어지거나 테이프가 정상적으로 붙어 있지 않은 경우 청테이프를 이용하여 위치 확인
- 음압기는 모두 정상적으로 가동하고 있는지 확인
- 음압기 배출구는 정상적으로 설치되어 있는지 확인

2호 안건

- 현장 안전 상태 점검

○ 석면 해체·제거작업 소모품및 필터, 습윤제, 고착제 비치

- 작업장에서 필요한 소모품, 필터, 습윤제, 고착제 작업장소에 비치
- 작업에 사용금지 용품(빗자루, 쓰레받기 등) 현장에 투입금지

○ **지정폐기물 처리방법 및 임시보관장소 확인**

- 지정폐기물 표지판 준비상태 및 내용기록 상태확인
- 지정폐기물 스티커 준비상태

○ **석면 해체·제거 감리와 석면 해체·제거 관리자, 관리감독자의 현장 상주**

- 감리원과 해체·제거 관리자, 관리감독자 사무실 업무형태 확인

○ **석면 해체·제거 작업장 통제**

- 비닐보양 작업과 일반 철거작업 시 일반 작업자에 대한 출입은 가능하나, 본 석면 작업이 진행될 경우 석면 작업 통제구역에 감리인 또는 관리자, 관리감독자 중 1인이 출입자 통제할 것.

3호 안전

- 특별 안전 및 비닐 보양·현장 안전점검 의견 청취

- 비닐보양작업 상태 및 음압 확인
- 관계자 외 출입통제선 확인
- 음압기록장치 확인
- 위생시설 확인
- 음압기확인
- 폐기물보관장소,폐기물반출구확인
- 지정폐기물 임시 보관장소 확인
- 비산측청기록장치 확인
- 발주처, 시공사, 석면감리, 석면해체업체, 석면조사기관, 관련기관, 주민감시단 단톡방 개설완료,

■ 제3차 석면합동협의회

□ 일 시 : 2022. 08. 19. (금) 오전 11:00

□ 장 소 : 서울 서초구 신반포로 45 (반포본동 812) 2층 회의실

□ 참석자 : 총17명

(사)석면피해예방지원센터 이사장최미경, (주)한국친환경연구소 이사임재항, (주)대한환경분석기관 부장박근영, (주)유비건축사사무소 부장유병기, (주)참마루건설 부장유병학, (주)참마루건설 대리조주영, (주)참마루건설 팀장노병일, 현대건설 책임매니저황보영일, 현대건설 팀장김대영, 현대건설 책임매니저김기환, 천호엔지니어링 소장 이재밍, 천호엔지니어링 염기조, 청연씨앤디 과장 이준범, 팀케이투건설 팀장유용덕, 팀케이투 부장조용식, 청연씨앤디 권유한

□ 논의안건

1호 안건

- 공구별 작업 일정

○ 천호

- 8월 11일 일부 해체작업을 진행.
- 현재는 보양 작업 진행 중.
- 학교 쪽 동은 개학으로 인해 학교 측과 상의 후 진행예정.
- 해체작업 다음 주 중순 예정.

○ 참마루

- 보양작업 11개동 완료.
- 현재 27동, 88동, 89동 보양 작업 진행 중.
- 해체작업 29일경으로 진행예정.

○ 청연C&D

- 15개동중 7개동 보양완료
- 현재 29,80,81동 보양 작업 진행 중
- 해체작업 29일경으로 예정.

○ 팀케이투건설

- 20개동중 68동, 69동, 70동, 57동 보양 작업 진행 중
- 해체작업 29일 예정

2호 안건

- 현장 비닐 보양 점검



- 전 공구 옥탑 보양상태 보완.

3호 안건

- 특별 안건

○ 폐기물 보관 상태확인

- 현재까지 폐기물 총 6대 발출.
- 현재 보관중인 폐기물 없음.

○ 샤워시설 사용 실태 확인

- 천호엔지니어링 샤워부스상태 양호
- 참마루 샤워부스상태 양호
- 청연이앤씨 작업전으로 수도연결 안되었음.

○ 현장점검외부점검

- 기존 화단에 섞여있던 밤라이트, 텍스조각 주변사항 확인 후 수거실시.
- 석면 잔재물로 인해 작업장 이외에 안전화 착용금지.

※ 차기 회의 일정 2022. 08. 29. (월) 13:30
