



## 반포주공1단지 [1, 2, 4주구] 제4차 석면 합동협의회

### ■ 제4차 석면 합동협의회

□ 일 시 : 2022.09.16. (금) 13:30

□ 장 소 : 서울 서초구 신반포로 45 (반포본동 812 ) 1층 야외직원쉼터

□ 참석자 : (사)석면피해예방지원센터, 이사장최미경(외1명), (주)한국친환경연구소 이사 임재항, (주)천호엔지니어링 소장최현식, (주)유비건축사사무소 부장노갑기, (주)유비건축사사무소 부장유병기, 천호엔지니어링 상무서원호, 청연씨앤디 부장김지훈, (주)대한환경분석기관 이사이치현, (주)참마루건설 소장유병학, (주)참마루건설 대리조주영, 팀케이투건설 부장정길수, 팀케이투건설 과장권태성

### □ 논의안건

#### 1호 안건

#### - 공구별 작업 일정

#### ○ 천호

- 보양진행중 10월 중순
- 64동 1.2호라인 해체작업
- 공사 진행사항 100% 중 30% 완료
- 현재 작업완료 예상일 10월 중순~10월 말

#### ○ 참마루

- 보양 14개동중 11개동 작업 진행중
- 해체작업 87동~90동중 3개동 완료, 4번째 동 진행중
- 공사 진행사항 100% 중 20% 완료
- 현재 작업완료 예상일 10월 말~11월 초

#### ○ 청연씨앤디

- 16개 동 중 10개 동 보양 상가 2블럭 보양 진행 중
- 해체작업 2개동 완료
- 공사 진행사항 100% 중 25% 완료
- 현재 작업완료 예상일 10월 말

○ 팀케이투건설


- 8개동 보양잡업 완료
- 2개동 해체완료
- 공사 진행사항 100% 중 10% 완료
- 현재 작업완료 예상일 10월 말~11월 중순

2호 안건

- 현장 작업 상태 점검


- 지정폐기물 명절전 명절전 천호엔지니어링, 청연씨앤디, 팀케이투건설 각 1대씩 반출
- 나머지 폐기물은 보관중.
- 보관지점 1번, 상하차시 1번 씩 비산측정 실시
- 건물해체작업 청연씨앤디, 천호 10월중순 예정

## ○폐기물 보관현장

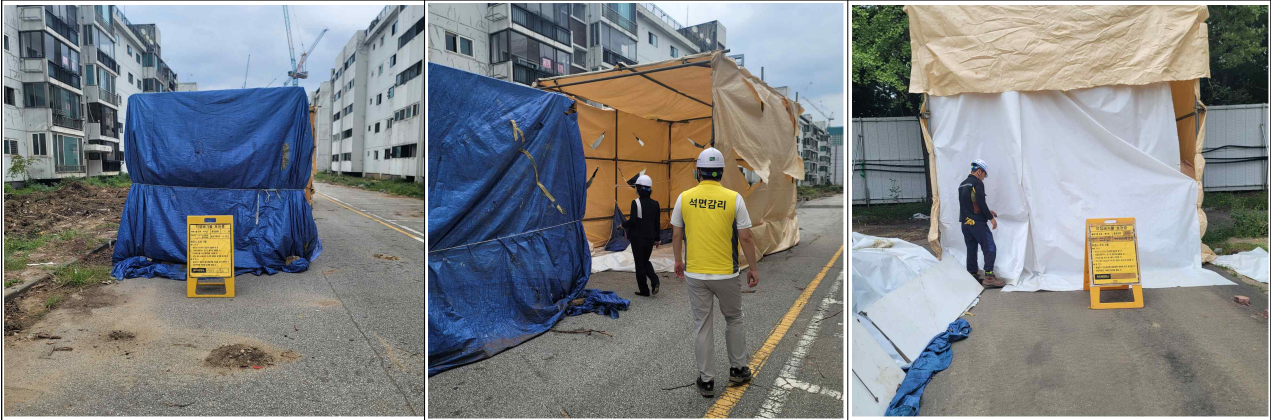

- 폐기물비닐보양 후 컨테이너에 넣고 한번더 컨테이너를 전체 비닐보양
- 우천시 구조물로 이중 비닐보양 설치

## ○직원 쉼터

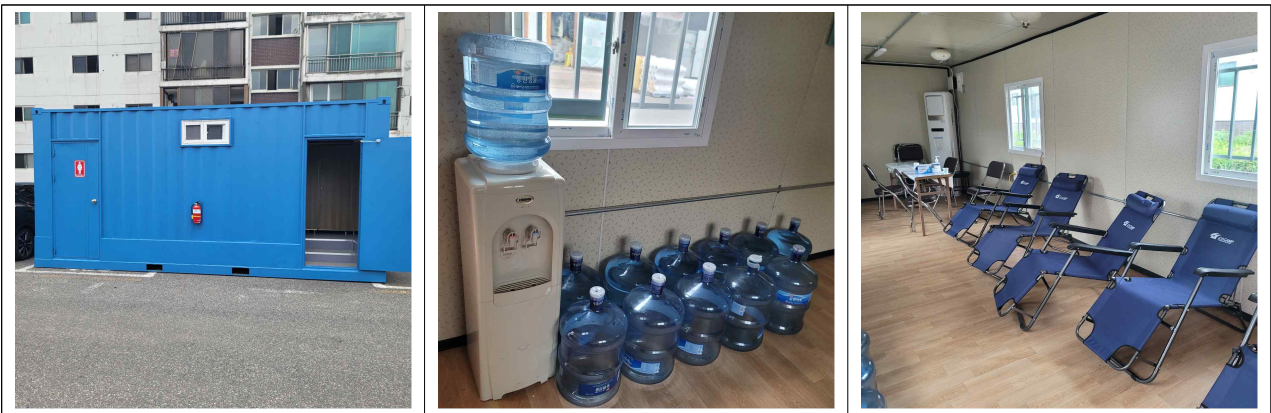

## ○외부농도표출기



- 외부 소음, 미세먼지, 석면 농도 표출기 설치 하였음

### 3호 안건

#### - 특별 안건

- 매일 아침 작업자 신상정보 확인 함.
- 철거작업이 진행할시 석면해체 작업자와 철거업체 작업자와 분리실시예정
- 석면해체 작업자와 철거 작업자 분리시 출입구, 이동경로 분리 예정
- 차기 회의는 10월 초 결정 하여 통지하기로 함.

※ 차기 회의 일정 2022.10월 중순 예정
