



반포아파트 제3주구

'제3차 석면 합동협의회'

■ 제3차 회의보고

- 일 시 : 2022. 08. 29. (월) 오전 10:30
- 장 소 : 서울 서초구 신반포로 32 반포주공아파트 19동 앞
- 참석자 : 사단법인석면피해예방지원센터, 반포3주구 재건축조합, 삼성물산, 해마건설(주), (주)베르원, 금강석면환경컨설팅, 에이에이건축사사무소, 서구청 가후환경과, 주민감시단

□ 논의안건

1호 안건


- 비닐 보양 점검 시 유의 사항

- 표지판 설치
- 비닐보양작업 상태 및 음압 확인
- 관계자외 출입통제선 확인
- 음압기록장치 확인
- 위생시설 확인
- 음압기확인
- 폐기물 보관장소, 폐기물 반출구확인
- 지정폐기물 임시 보관장소 확인
- 비산측청기설치 상태확인
- 발주처, 시공사, 석면 감리, 석면 해체업체, 석면조사기관, 관련기관, 주민감시단 단독방개설완료

※ 위생설비 출입 전 음압 기록장치를 확인하도록 한다.

작업장 외부와 내부의 음압은 작업 중 작업자의 출입과 작업공간 공기의 흐름에 따라 음압이 깨지는 경우가 발생함으로 최초 **-0.508mmH2O**를 유지한 상태에서 작업을 시작하도록 한다.

○ 표지판 설치

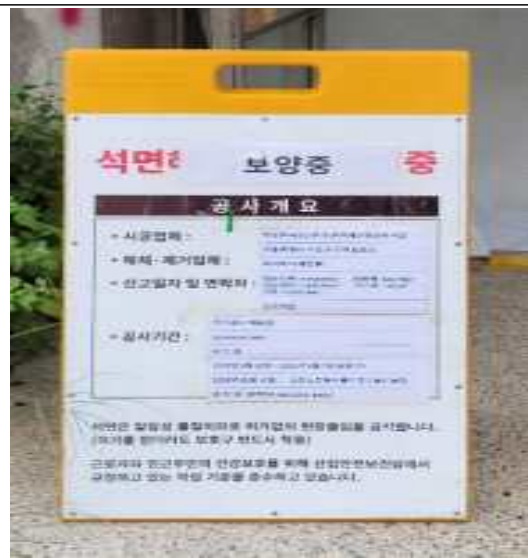

○ 위생설비 및 폐기물 반출구 확인

※ 위생설비 출입 전 음압 기록장치를 확인하도록 한다.

작업장 외부와 내부의 음압은 작업 중 작업자의 출입과 작업공간 공기의 흐름에 따라 음압이 깨지는 경우가 발생함으로 최초 **-0.508mmH₂O**를 유지한 상태에서 작업을 시작하도록 한다.



평상복탈의실 개인용품보관함



샤워실



작업복 탈의실



○ 작업장 출입순서

평상복 탈의실→샤워실→작업복 탈의실→작업장

○ 작업장 퇴실 순서


작업장→작업복 탈의실→샤워실→평상복탈의실

※ 작업장 내부에서 음압이 공기를 작업장으로 유입함으로 위생시설을 통해 분진이 외부로 비산되지 않음.

○ 음압기 설치

○ 비닐 보양 작업장 내부 점검

- 음압으로 비닐을 고정한 테이프가 떨어지거나 고정상태가 불안할 경우 보안 요청
- 비닐이 찢어지거나 테이프가 정상적으로 붙어 있지 않은 경우 청테이프를 이용하여 위치 확인
- 음압기는 모두 정상적으로 가동하고 있는지 확인
- 음압기 배출구는 정상적으로 설치되어 있는지 확인

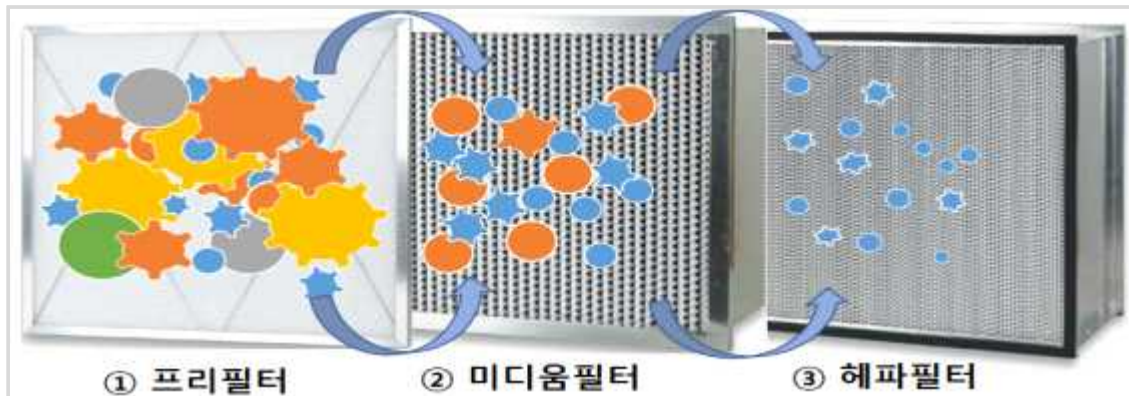

※ 당해 현장 필터 교체주기 : 프리필터일1회, 미디움필터2주 1회, HEPA필터 월 1회
 ※ 비산 측정 결과는 서초구청 익일 즉시 보고

2호 안전

- 현장 안전 상태 점검

- 석면 해체·제거작업 소모품 및 필터, 흡윤제, 고착제 비치
 - 작업장에서 필요한 소모품, 필터, 흡윤제, 고착제 작업장소에 비치
 - 작업에 사용금지 용품(빗자루, 쓰레받기 등) 현장에 투입금지
- 지정폐기물 처리방법 및 임시보관장소 확인
 - 지정폐기물 표지판 준비상태 및 내용기록 상태확인
 - 지정폐기물 스티커 준비상태
- 석면 해체·제거 감리와 석면 해체·제거 관리자, 관리감독자의 현장 상주
 - 감리원과 해체·제거 관리자, 관리감독자 사무실 업무형태 확인
- 석면 해체·제거 작업장 통제
 - 비닐보양 작업과 일반 철거작업 시 일반 작업자에 대한 출입은 가능하나, 본 석면 작업이 진행될 경우 석면 작업 통제구역에 감리인 또는 관리자, 관리감독자 중 1인이 출입자 통제할 것.

3호 안전

- 특별 안전 및 비닐 보양·현장 안전점검 의견 청취

-
-
-
-
-

—
